동탄역 환승센터

사업개요

○ 사업위치: 화성동탄(2)지구 동탄역 인근

○ 사업내용: 교통시설간(SRT, GTX, 동인선, 버스, 승용차 등) 환승시설 설치

○ 시행주체: 한국토지주택공사(LH)

○ 사 업 비: 동탄2 광역교통개선대책 부담금 2,932억 원(동탄역사 포함)

추진현황

○ 2009. 9. 광역교통개선대책 수립

○ 2016. 12. 동탄역 개통(SRT)

○ 2021. 7. 지하환승보행로 개통(시범단지~동탄역)(LH)

○ 2022. 3. 지상환승체계 추진 확정

○ 2022. 9. 경부직선화 상부공원 조경 기본 및 실시설계 착수

○ 2022. 10. 동탄트램 기본설계 착수(화성시)

○ 2023. 5. 동탄트램 동탄역 정거장 계획 확정·통보(화성시→LH)

○ 2024. 5. 동탄역 환승센터 상부환승시설 배치 설계완료 및 공사발주(LH)

○ 2024. 6. 상부환승시설(서측도로 개설) 공사 착공(LH)

○ 2024. 7. 경부직선화 환승광장(상부공원) 공사 착공(LH)

○ 2024. 11. 동인선 117정거장 환승연결통로 착공(KR)

○ 2024. 12. 상부환승시설(서측도로 개설) 공사 준공(LH)

○ 2025. 2. 여울공원 환승지하주차장(566면) 공사 준공(LH)

○ 2025. 4. 수도권 고속철도 동탄통합역사 동측주차장 램프 공사 착공(KR)

○ 2026. 7. 수도권 고속철도 동탄통합역사 동측주차장 램프 공사 준공(KR)

○ 2026. 8. 동탄역 지하주차장 진출입로 변경


추진계획

○ 2028. 12. 경부직선화 환승광장(상부공원) 공사 준공(LH)

○ 2029. 下. 동인선 117정거장 환승연결통로 개통(KR)

광역환승센터 추진 현황

구 분	개요	사업주체	추진현황	추진계획 (잔여공사분)
1 동탄역사	SRT, GTX-A	KR	개통('16.10.)	서측출입구, E/V 등
2 환승주차장(1)	역사내(414면)	KR	개통('16.10.)	주차장 진·출입램프
3 환승주차장(2)	공원지하(566면)	LH	준공('25.2.)	인수인계 협의 등
4 지하환승보행로	L=650m	LH, 민간	시범단지~동탄역 운영중 ('21.7)	중상1부지 하부통로 매각시 개설 예정
5 상부 환승광장	약 3만㎡	LH	공사착수('24.6.)	공사준공('28.12.)
6 지상 환승시설	트램, 버스, 택시 등	LH, 화성시	서측도로 개통 ('24.12.)	-

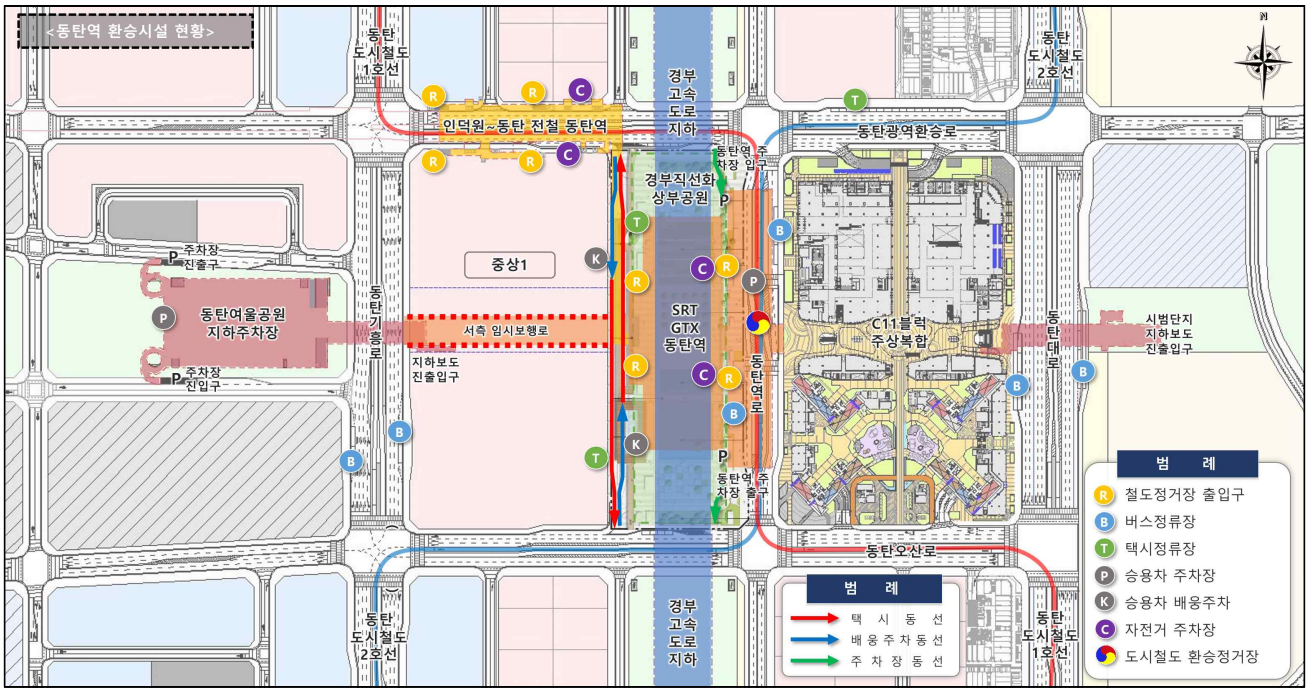

화성특례시 HWASEONG SPECIAL CITY	담당부서	철도전략과	철도사업팀	☎031-5189-5193
