신안산선 향남 연장

사업개요

○ 사업위치: 가칭국제테마파크 ~ 서화성 ~ 화성시청 ~ 향남

○ 사 업 량: L=22.3㎞

○ 소요예산: 2,007억 원 ＊향후 실시설계 결과에 따라 변동 가능

○ 노선도



추진현황

○ 2020. 4. ~ 2021. 3. 사전 타당성조사(市)

○ 2021. 8. 신안산선 연장 사업 건의(市→국토교통부)

○ 2021. 9. ~ 2022. 6. 타당성 검증 ☞ 경제성확보(B/C > 1)

○ 2022. 12. 신안산선 향남 연장 운영 승인(국토교통부)

○ 2023. 3. ~ 2023. 11. 타당성 조사(한국지방행정연구원)

○ 2023. 5. 위·수탁 협약 체결(市, 국가철도공단, 한국철도공사, 넥스트레인)

○ 2023. 12. ~ 2024. 3. 중앙 투자심사(행정안전부)(심사결과 : 재검토)

○ 2024. 7. ~ 2024. 10. 중앙투자심사 재의뢰(행정안전부)(심사결과 : 조건부)

○ 2024. 12. 화성시의회 제237회 정례회 안건상정 및 의결

○ 2025. 1. 사업비 납부(市→국가철도공단, 넥스트레인)

○ 2025. 5. ~ 2026. 下. 실시설계

- 노반·궤도[5월], 전기·신호[6월], 신호[8월], 수요·운전[9월], 환경영향평가[10월] 착수
- 노선계획(안)[반복선] 관계기관, 관계부서 협의[12월] 및 회신[26년 1월]

○ 2026. 8. 열차운행계획 및 수요분석 용역 추진(넥스트레인)


추진계획

○ 2025. 5. ~ 2027. 3. : 기본 및 실시설계 추진(2026. 10. 기준 공정률 70%)

○ 2027. 下. 실시계획 승인 및 사업착수

○ 2030. 下. 준공 및 개통 ※실시설계 완료 이후 사업기간 확정예정

노선도

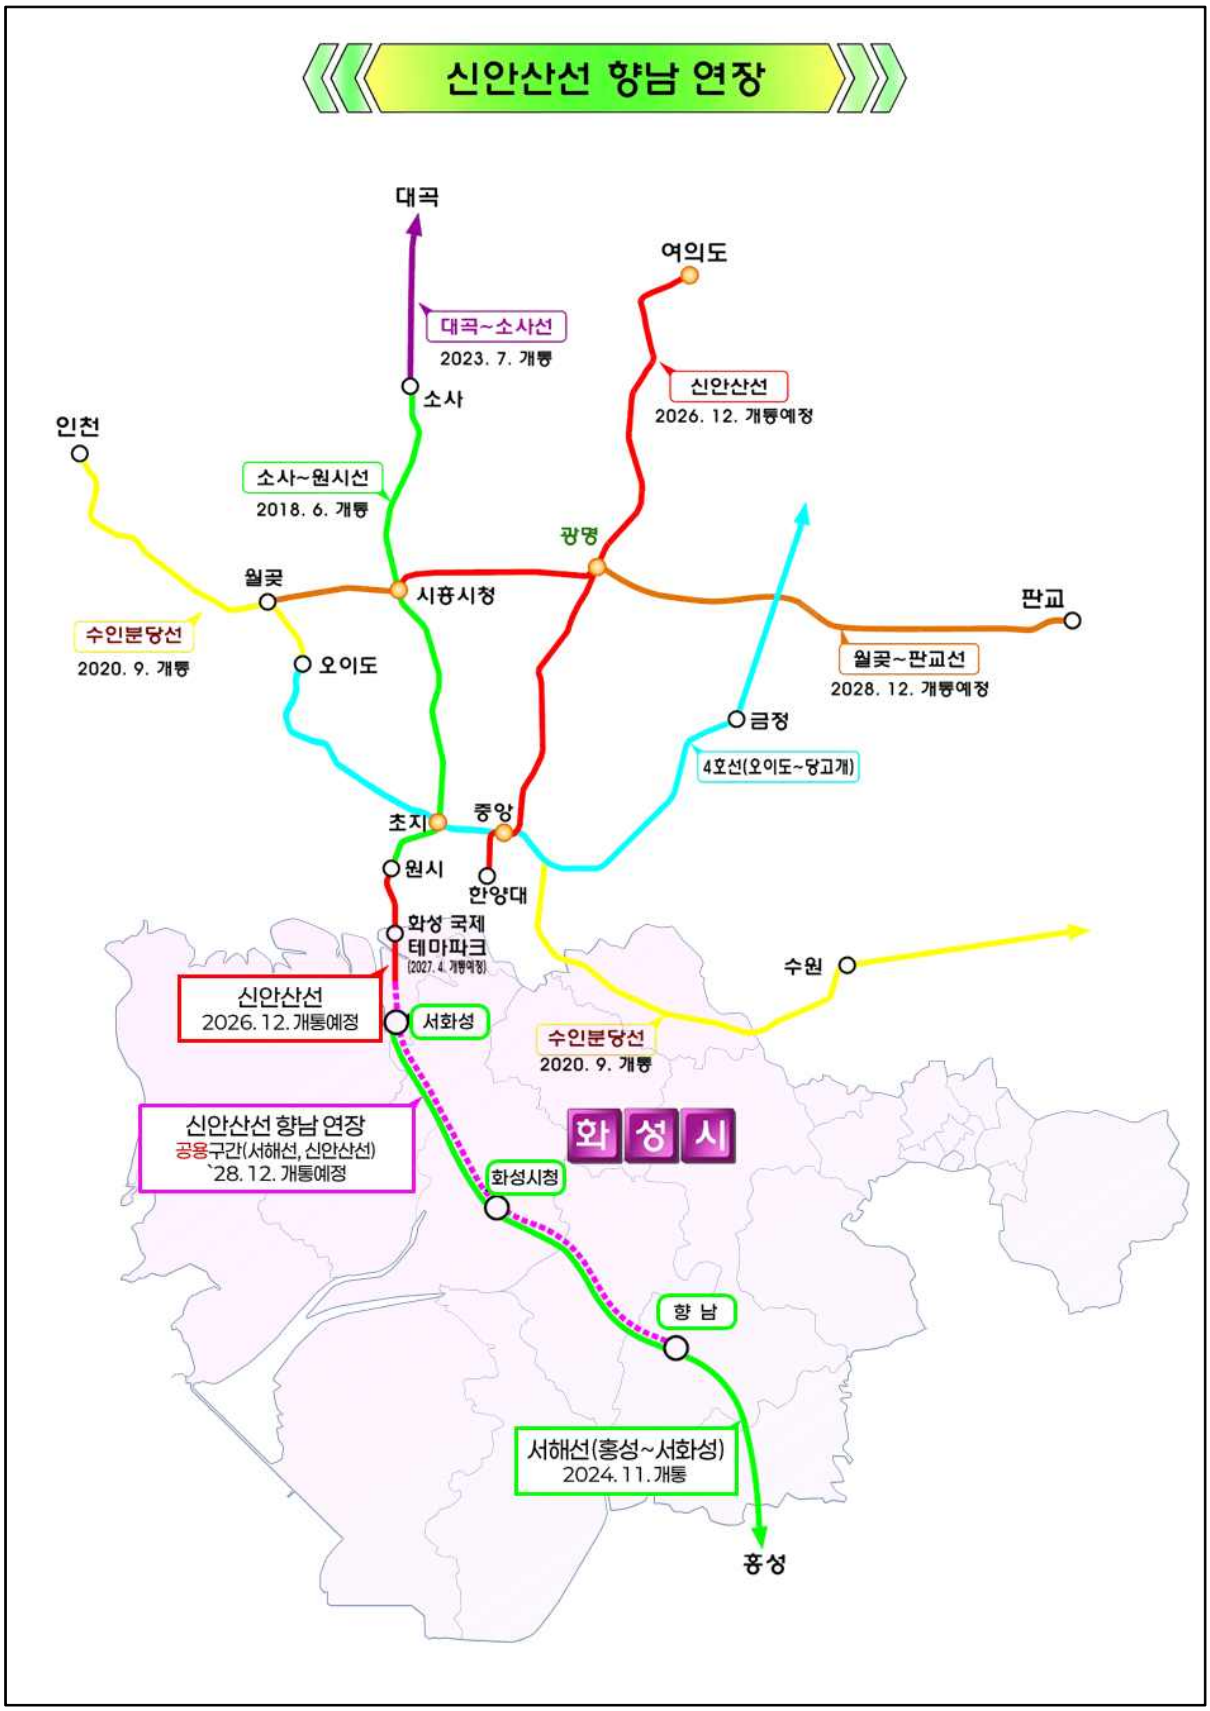

화성특례시 HWASEONG SPECIAL CITY	담당부서	철도전략과	철도사업팀	☎031-5189-5193
